

**DECRETO N. 1572 DEL 23/12/2025
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.3 - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA
REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP
E67H21009320002 - APPROVAZIONE SAL N. 1**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 *“Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale”* Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;

Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Viadana per un costo complessivo pari ad € 150.000,00;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

con Decreto n. 11696 del 04.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 150.000,00 per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Viadana;

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 52 del 02.03.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all’A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Viadana, ulteriori fondi per un importo pari ad € 11.030,14;

TENUTO CONTO che la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Viadana è finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.3;

DATO ATTO che:

il Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento è stato individuato con atto n. 1144 del 09.10.2025 nell’Arch. Alessandro Campera, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in sostituzione dell’Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, precedentemente individuata con atto n. 242 del 16.03.2022;

con decreto n. 535 del 23.05.2023 è stata affidata a INC Ambiente e Territorio s.r.l., mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, la progettazione definitiva dell’Ospedale

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

di Comunità di Viadana;

con decreto n. 728 del 30.06.2023, rettificato con decreto n. 1060 del 30.09.2023 sono stati affidati al R.T.I. formato da Imprendo Italia s.r.l. (mandataria) e Società per Azioni Commerci Combustibili Industria e Riscaldamento s.a.c.c.i.r. (mandante), mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, i lavori in appalto integrato per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana;

in data 30.09.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato per la realizzazione dell'intervento;

con decreto n. 1060 del 30.09.2023 è stato inoltre approvato il progetto definitivo del suddetto intervento;

con decreto n. 236 del 03.03.2025 è stato approvato il primo stralcio (lotto 0) del progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana;

in data 03.03.2025 si è proceduto pertanto alla consegna dei lavori, come da verbale conservato in atti, prot. n. 16902/2025;

con decreto n. 97 del 28.08.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana;

CONSIDERATO che con decreto n. 455 del 23.04.2025 questa A.S.S.T ha approvato e autorizzato la liquidazione dell'anticipazione contrattuale, pagata con ordinativo di pagamento n. 5740 del 29.04.2025 per un importo pari ad € 17.294,20 oltre Iva di legge per € 1.729,42, pari a complessivi € 19.023,62;

VISTI:

- la documentazione contabile relativa al 1° SAL, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), redatta dal Direttore Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 24.11.2025;
- il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal RUP (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 1 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 24.11.2025, dell'importo di € 61.315,67 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 6.131,67, pari a complessivi € 67.447,24;

RITENUTO pertanto:

- di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 1 (Allegato 1) riferito ai lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana, eseguiti a tutto il 24.11.2025;
- di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto (Allegato 2), per un importo pari ad € 61.315,67 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 6.131,67, pari a complessivi € 67.447,24, all'impresa Imprendo Italia S.p.A. P. IVA 11213441006;

DATO ATTO che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2025, e sarà finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e

da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 1 (Allegato 1) riferito ai lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Viadana, eseguiti a tutto il 24.11.2025;
2. di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto (Allegato 2), per un importo pari ad € 61.315,67 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 6.131,67, pari a complessivi € 67.447,24, all'impresa Imprendo Italia S.p.A. P. IVA 11213441006;
3. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2025, e sarà finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

**DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA**

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C1 – 1.3 – OSPEDALE DI COMUNITA' DI VIADANA - CUP E67H21009320002

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

SAL 01 al 24.11.2025

OSPEDALE DI COMUNITA'

Regione: Lombardia
Provincia: Mantova
Comune: Viadana
LUOGO: Largo Alcide de Gasperi, 7, Viadana (MN)
INTERVENTO: Ospedale di Comunità di Viadana
C.I.G.: 9753167804
COMMITTENTE: ASST Carlo Poma - Mantova
RUP: Arch. Alessandro Campera
PROGETTISTA GENERALE E CSP: Operatore Economico indicato A.T. Advanced Technologies s.r.l. nelle persone ingg. Gabriele Novembri progettista e coordinatore delle discipline specialistiche e Matteo Novembri CSP
APPALTATORE: ATI con mandataria Imprendo Italia srl, con sede Viale Giorgio Ribotta, 21 – 00144 Roma, P.IVA 11213441006 (divenuta Imprendo Italia Spa a decorrere dal 05/02/2024), mandante S.A.C.C.I.R. con sede in Roma, via delle Ande, 39 - 00144 Roma, P. IVA 03565421009; costituite in LA.IT. 1 s.c.a.r.l., C.F. 17230311007 il 30/06/2023.
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Massimiliano Baruffi – PoolMilano Srl

04 - STATO AVANZAMENTO LAVORI

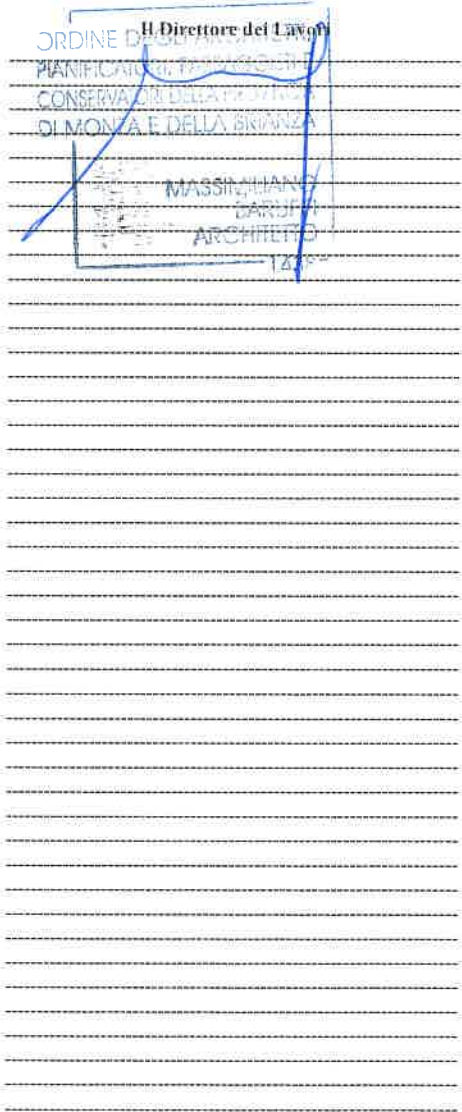
Data consegna	03/03/2025	Importo netto lavori	€	83.848,49
Data inizio lavori	03/03/2025	Oneri per la sicurezza	€	3.041,80
Durata lavori	207 giorni	Importo contrattuale	€	86.890,29
Data ultimazione	28/02/2026			
Giorni di sospensione	-	Perizia lavori	€	
Numero sospensioni	-	Oneri sicurezza variante	€	
Proroga lavori	-	Importo contrattuale variante	€	
Giorni di proroga	-			
Nuova data ultimazione	-	Anticipazione	€	17.294,20

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICAZIONE, PROGETTO E
CONSERVAZIONE
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Massimiliano Baruffi
MASSIMILIANO
BARUFFI
ARCHITETTO
1434

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 1C.01.040.01 00 a	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e gracidura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisorie, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm	SOMMANO m	5,50	26,15
				143,83
2 1C.01.050.00 30 a	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisorie di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante	SOMMANO m²	97,81	22,00
				2'151,82
3 1C.01.060.00 10 a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in tegole di laterizio, cemento e simili	SOMMANO m²	436,78	11,61
				5'071,02
4 1C.01.060.00 10 b	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina	SOMMANO m²	338,98	10,77
				3'650,81
5 1C.01.060.00 20 b	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - assito in tavole di abete accostate	SOMMANO m²	338,98	9,69
				3'284,72
6 1C.01.060.00 70 a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati	SOMMANO m²	534,59	4,46
				2'384,27
7 1C.04.450.00 10 a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C	SOMMANO kg	41,56	2,12
				88,11
8 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature	SOMMANO kg	330,04	2,09
				689,78
9 1C.05.710.00 30 a	Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio o vetroresina. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura - in perfori fino a Ø 8 mm	SOMMANO m	36,60	11,50
				420,90
10 1C.05.710.00 30 c	Iniezioni in perfori già predisposti in strutture in legno, con resina epossidica con impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione, per consolidamenti, chiodature, rinforzi con barre di acciaio o vetroresina. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, la resina epossidica fino a completa saturazione, la pulizia finale. Escluse le eventuali rimozioni, i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, le opere murarie, l'armatura - in perfori oltre Ø 14 e fino a Ø 26 mm	SOMMANO m	5,50	20,08
				110,44
11 1C.06.720.00 30	Muratura a cuccioli con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture preesistenti lesionate o da risanare. Compresi la malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i			
	A RIPIETTERE			17'995,70

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			17'995,70
	nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento			
	SOMMANO m³	4,39	804,36	3'531,14
12 1C.11.010.00 10 a	Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso: spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisoriale e di protezione. Eseguita con: - travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname			
	SOMMANO m³	6,14	1'303,94	8'006,19
13 1C.11.010.00 60 a	Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in legno abete, sez. 3 x 5/3,5 x 3,5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: - in tegole piane marsigliesi			
	SOMMANO m²	938,86	12,32	11'566,76
14 1C.11.020.00 30 a	Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfidi, chiodatura alla sottostante struttura. - spessore 10,0 mm			
	SOMMANO m²	26,96	20,41	550,25
15 1C.22.020.00 10 a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine, trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm			
	SOMMANO kg	2'050,00	4,74	9'717,00
16 1C.24.200.00 10	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie			
	SOMMANO m²	1'112,74	3,77	4'195,03
17 1C.24.720.00 20	Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie			
	SOMMANO m²	224,72	2,81	631,46
18 AP.05	Fornitura e posa in opera linea vita tipo C" certificata per le seguenti norme EN 795:2012, CEN/TS 16415:2014 e UNI 11158:2015, composta da piastre (dispositivi di ancoraggio) in acciaio INOX AISI 304 tipo "Sicural LVBD" o similare. La piastra del dispositivo deve avere dimensioni 218x150 mm spessore 10 mm con 4 fori per il fissaggio. L'ala verticale ha invece 3 fori per il fissaggio della linea vita o per l'aggancio dell'operatore. Il fissaggio avviene mediante 4 barre ø 12 mm, sgrassate e fissate mediante resina bicomponente alla struttura portante. Il sistema di ancoraggio (linea vita) deve essere composto da: cavo ø 8mm a 49 fili in acciaio INOX AISI 316, tenditore a elevato tensionamento (25 cm) in acciaio INOX AISI 316 con scocca chiusa per il mantenimento di funzionalità e la protezione da polvere e agenti atmosferici durante gli anni successivi, terminali a crimpare in acciaio INOX AISI 316 con forcina maggiorata (35 mm) e snodata, dissipatore di energia in grado di ridurre l'energia cinetica generata durante la caduta. La lunghezza di quest'ultimo deve essere di 40 cm e con forma sinusoidale a 4 onde, il materiale di costruzione deve essere in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato, passacavo in lega dall'alluminio o passacavo in acciaio bypassabile per l'utilizzo con navetta. Il sistema in oggetto deve essere installato da azienda con personale qualificato in grado di dimostrare di aver svolto un corso di formazione per installatore di linee vita. Alla conclusione dell'installazione dovranno essere svolte prove di collaudo sia con chiave dinamometrica che con kit di collaudo in grado sia di applicare una forza di carico al dispositivo in maniera verticale che di registrare su report non modificabile la curva del test svolto			
	SOMMANO a corpo	1,00	6'340,00	6'340,00
19 AP.06	Fornitura e posa in opera linea vita tipo C" certificata per le seguenti norme EN 795:2012, CEN/TS 16415:2014 e UNI 11158:2015, composta da piastre (dispositivi di ancoraggio) in acciaio INOX AISI 304 tipo "Sicural LVBD" o similare. La piastra del dispositivo deve avere dimensioni 218x150 mm spessore 10 mm con 4 fori per il fissaggio. L'ala verticale ha invece 3 fori per il fissaggio della linea vita o per l'aggancio dell'operatore. Il fissaggio avviene mediante 4 barre ø 12 mm, sgrassate e fissate mediante resina bicomponente alla struttura portante. Il sistema di ancoraggio (linea vita) deve essere composto da: cavo ø 8mm a 49 fili in acciaio INOX AISI 316, tenditore a elevato tensionamento (25 cm) in acciaio INOX AISI 316 con scocca chiusa per il mantenimento di funzionalità e la protezione da polvere e agenti atmosferici durante gli anni successivi, terminali a crimpare in acciaio INOX AISI 316 con forcina maggiorata (35 mm) e snodata, dissipatore di energia in grado di ridurre l'energia cinetica generata durante la caduta. La lunghezza di quest'ultimo deve essere di 40 cm e con forma sinusoidale a 4 onde, il materiale di costruzione deve essere in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato, passacavo in lega dall'alluminio o passacavo in acciaio bypassabile per l'utilizzo con navetta. Il sistema in oggetto deve essere installato da azienda con personale qualificato in grado di dimostrare di aver svolto un corso di formazione per installatore di linee vita. Alla conclusione dell'installazione dovranno essere svolte prove di collaudo sia con chiave dinamometrica che con kit di collaudo in grado sia di applicare una forza di carico al dispositivo in maniera			
	A R I P O R T A R E			62'533,53

COMMITTENTE ASST MANTOVA
STATO AVANZAMENTO LAVORI IN DATA TUTTO IL 24/11/2025

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>			
	<i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i>			
	LAVORI A MISURA euro			86'236,96
	Ribasso del 14,2% da applicare su 86'236,96			- 12'245,65
	PER LAVORI A MISURA euro			73'991,31
	COSTI DELLA SICUREZZA euro			3'041,80
	TOTALE euro			77'033,11
	Data: 24/11/2025			
	L'Impresa			
				
	A RIPORTARE			

